



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
ДОКТААЛ

от 4 декабря 2024 г. № 562

г. Кызыл

**Об утверждении доклада о реализации
государственной программы Республики
Тыва «Энергоэффективность и развитие
энергетики на 2014-2027 годы»
за период с 2014 года по 2023 год**

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 постановления Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва» Правительство Республики Тыва **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» за период с 2014 года по 2023 год.
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва



В. Ховалыг

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва

от 4 декабря 2024 г. № 562

ДОКЛАД

о реализации государственной программы
Республики Тыва «Энергоэффективность и
развитие энергетики на 2014-2027 годы»
за период с 2014 года по 2023 год

1. Общая часть

Реализация государственной политики Республики Тыва в сфере топливно-энергетического комплекса осуществляется в рамках государственной программы Республики Тыва «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 20 декабря 2013 г. № 750.

Государственным заказчиком и ответственным исполнителем Программы является Министерство топлива и энергетики Республики Тыва (далее – Министерство).

Основная цель Программы – надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей Республики Тыва в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности; создание условий для перевода сектора экономики, бюджетной сферы и населения на энергосберегающий путь развития.

Для достижения целей программы поставлены следующие задачи:

безаварийное прохождение осенне-зимнего периода;

повышение эффективности теплоснабжения республики путем реконструкции и технического перевооружения предприятий топливно-энергетического комплекса;

повышение эффективности производства и потребления топливно-энергетических ресурсов;

разработка проектно-сметной документации строительства объектов теплоснабжения;

строительство объектов электро- и теплоснабжения.

К целевым индикаторам Программы относятся:

повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электро-снабжения Республики Тыва;

рост производства тепловой энергии и электрической энергии дизельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2027 году;

снижение потребления среднего расхода топлива (каменный уголь) от 29 до 31 процента к 2027 году;

сохранение и модернизация 514 рабочих мест в действующих котельных и дизельных электростанциях;

увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2027 году.

Ожидаемыми результатами при реализации Программы за период с 2014 по 2027 гг. являются:

- повышение энергетической безопасности и надежности тепло- и электроснабжения Республики Тыва;

- рост производства тепловой энергии и электрической энергии дизельными электростанциями от 3 до 5 процентов к 2027 году;

- снижение потребления среднего расхода топлива (каменный уголь) от 29 до 31 процента к 2027 году;

- увеличение полезного отпуска электроэнергии от 10 до 20 процентов к 2027 году;

- увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Тыва до 500 млн. рублей к 2027 году.

2. Результаты реализации Программы

В отчете исполнения целевых показателей Программы по состоянию на 1 января 2024 г. отражены данные из обзора социально-экономического развития Республики Тыва.


Топливо-энергетический комплекс												
Наименование показателей	Ед. из.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	итого
Производство электроэнергии	млн. кВт. час	68,4	84	99,2	101,8	99,6	106,8	105,1	106,6	116,3	102,3	990,1
Объем добычи угля	тыс. т	747	1022	1314	1487	1766,1	1704,6	655	647	1424	1385,9	12152,6

В сфере электроэнергетики функционирует два предприятия – АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и ООО «Дизель».

1. За период с 2014 г. по 2023 г. произведено электроэнергии в количестве 990,1 млн. кВт. час.

Наблюдается уменьшение производства электроэнергии в 2018 г. на 2,2 процента по сравнению с 2017 г., в 2020 г. на 1,6 процента по сравнению с 2019 г., также значительное уменьшение отражается в 2023 г. на 12 процентов по сравнению с 2022 г. Данное снижение обусловлено тем, что предприятие по распределению электроэнергии АО «Тываэнергосбыт» признано банкротом в мае 2022 г.

Производство, передача и распределение электроэнергии, млн. кВт. час

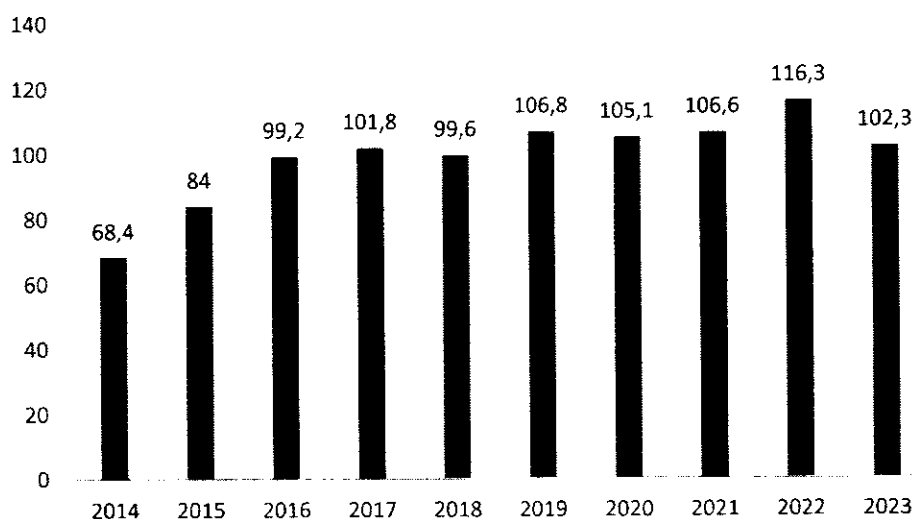

2. На сегодняшний день в угледобывающей отрасли Республики Тыва функционирует два предприятия, в том числе:

- ООО «УК «Межегейуголь»

Добыча угля осуществлялась с 2016-2020 гг. В 2021 году была приостановка добычи, с 2022 г. добыча каменного угля на угледобывающем комплексе возобновлена;


- ООО «Тувинская горнорудная компания».

Добыча угля осуществляется открытым способом на двух участках угольных месторождений – Каа-Хемском и Чаданском.

Всего объем добытого каменного угля за период с 2014 по 2023 г. составляет 12152,6 тыс. тонн.

Объем добычи угля в 2020 и 2021 гг. уменьшился, в связи с приостановкой деятельности ООО «УК Межегейуголь».

Объем добычи угля, тыс. тонн

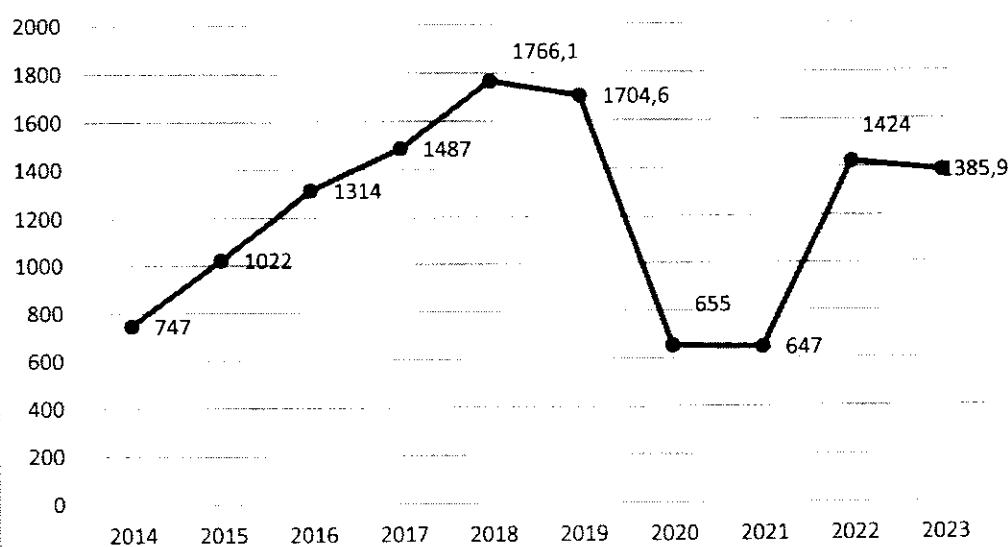

Исполнение мероприятий за период с 2014 по 2023 гг.

Год	Общее количество мероприятий	Исполнено/ в исполнении	Не исполнено	Степень реализации государственной программы
2014	8	8	0	100%
2015	6	6	0	100%
2016	9	8	1	88%
2017	9	7	2	77%
2018	10	9	1	90%
2019	13	13	0	100%
2020	17	17	0	100%
2021	22	22	0	100%
2022	17	16	1	94%
2023	17	17	0	99,96%
Среднее значение	13	13	1	98%

В 2014 г. реализованы следующие мероприятия:

1) мероприятие по научно-исследовательским опытно-конструкторским работам на сумму 5880,38 тыс. рублей, в том числе:

- проведение экспертизы схем теплоснабжения поселений и городских округов (гг. Шагонар и Ак-Довурак) – 200,0 тыс. рублей;

- проведение экспертизы схемы теплоснабжения с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна – 380,88 тыс. рублей;

- разработка ПСД модульной котельной с магистральными тепловыми сетями в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна – 4600,0 тыс. рублей;

- разработка ПСД реконструкции (нового строительства) энергоисточника для нужд г. Шагонара – 499,5 тыс. рублей;

2) корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергии Республики Тыва на период до 2019 года на сумму 1500,0 тыс. рублей.

Утверждена скорректированная Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период до 2019 года (постановление Правительства Республики Тыва от 2 июля 2014 г. № 327). Подрядная организация – ЗАО «СибНТЦ». Профинансировано по контракту 1500 тыс. рублей;

3) подготовка к осенне-зимнему периоду и предотвращение чрезвычайных ситуаций на сумму 70674,8 тыс. рублей.

Субсидии предприятиям на капитальный ремонт. Договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг заключены. Ремонтные работы идут в плановом порядке. Контрагентам за выполненные работы средства перечислены. ГУП Республики Тыва «Ак-Довуракэнерго» – 30 128,8 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Шагонартепло» – 3 174,96 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Прогресс-тепло» – 7 937,04 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Котельная с. Хову-Аксы» – 27 378,03 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Грузовые перевозки» – 2 055,9 тыс. рублей;

4) субсидии ГУП Республики Тыва «ЕРЭС» на сумму 2200 тыс. рублей.

Республиканский праздник животноводов «Наадым-2014» обеспечен электроэнергией в сумме 2200 тыс. рублей;

5) погашение убытков по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов на сумму 60576,0 тыс. рублей.

Выделенные средства направлены на погашение кредиторской задолженности предприятий ТЭК, на приобретение и доставку угля, приобретение сжиженного газа, оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы и прочее, в том числе:

ГУП Республики Тыва «Ак-Довуракэнерго» – 24516,0 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Прогресс-тепло» – 9154,0 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Шагонартепло» – 15878,0 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Котельная с. Хову-Аксы» – 7567,0 тыс. рублей, ОАО «Тувгаз» – 3461,0 тыс. рублей;

6) субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) на сумму 27100,0 тыс. рублей.

ГУП Республики Тыва «Ак-Довуракэнерго» – 10370,39 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Прогресс-тепло» – 5819,629 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Шагонартепло» – 7664,391 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Котельная с. Хову-Аксы» – 3245,59 тыс. рублей; ГУП Республики Тыва «Ак-Довуракэнерго» – 3490,13 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Шагонартепло» – 3608,96 тыс. рублей, ГУП Республики Тыва «Котельная с. Хову-Аксы» – 1300,91 тыс. рублей;

7) субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ДЭС) на сумму 27183,2 тыс. рублей:

- 21956,2 тыс. рублей – Тоджинская ДЭС;

- 5227 тыс. рублей – Тере-Хольская ДЭС;

8) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую муниципальными организациями коммунального комплекса (ДЭС), в том числе на сумму 157625,5 тыс. рублей (ФБ – 23375, РБ – 134250,0), в том числе:

- котельная с тепловыми сетями п. Хову-Аксы Чеди-Хольский кожуун – 104621,3 тыс. рублей;

- капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности – 94456,5 тыс. рублей (освоено – 39115,69 тыс. рублей. Профинансировано в сумме 39 115,7 тыс. рублей. Из них: кредиторская задолженность по программе 2013 года в сумме 19415,40254 тыс. рублей (объекты Службы ГО и ЧС – 3136,729 тыс. рублей, Минсельхозпрода – 941,440 тыс. рублей, Службы ветеринарии – 5839,122 тыс. рублей, Минобразования – 4410,07967 тыс. рублей, Минкультуры – 2 679,872 тыс. рублей, Минздрава – 2390,02 тыс. рублей, Минтруда – 1121,980 тыс. рублей); судебные издержки по кредиторской задолженности программы 2013 года – 162,4 тыс. рублей; Рес-больница № 1 (система вентиляции) – 14 788,902 тыс. рублей; капремонт здания Верховного Хурала – 1686,734 тыс. рублей);

- строительство котельной гг. Шагонар, Ак-Довурак – 405189,9 тыс. рублей федеральный бюджет (по итогам конкурсных процедур государственным унитарным предприятием «Управляющая компания ТЭК 4» определен застройщик в лице АО «ЭСК «СОЮЗ». Профинансирован аванс в сумме 307856,325 тыс. рублей на приобретение оборудования и материалов для строительства котельных гг. Шагонар и Ак-Довурак (153928,1625 тыс. рублей на строительство котельной в г. Шагонар и 153928,1625 тыс. рублей на строительство котельной в Ак-Довурак).

По итогам проведения аукциона по модернизации узлов учета энергоресурсов ЖКХ г. Кызыла договор заключен с ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» на сумму 6651,6 тыс. рублей. Профинансирована вся сумма.

Разработка проектной документации строительства котельной гг. Шагонар и Ак-Довурак. Проектной организацией АО «ЭСК «СОЮЗ» разработан 1 и 2 этапы работ, в том числе основные технические решения и проектная документация. Профинансировано 90682 тыс. рублей из федерального бюджета (из них 45341,0 тыс. рублей на ПСД котельной г. Шагонар и 45341,0 тыс. рублей на ПСД котельной г. Ак-Довурак).

В 2015 г. реализованы следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности – 98485,91 тыс. рублей (96 процентов).

Выплачена кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году, в том числе по линии Минтруда Республики Тыва – 13971,01 тыс. рублей, по линии Минстроя Республики Тыва – 80614,95 тыс. рублей;

2) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию ДЭС, – 166870,2 тыс. рублей.

В том числе профинансировано (в разбивке по районам):

Каа-Хемский район – 4337 тыс. рублей;

Монгун-Тайгинский район – 53239 тыс. рублей;

Пий-Хемский район – 3508 тыс. рублей;

Тере-Хольский район – 17088 тыс. рублей;

Эрзинский район – 3237 тыс. рублей;

Тоджинский район – 85461 тыс. рублей;

3) субсидии на погашение выпадающих доходов предприятий ТЭК, связанных с государственным регулированием тарифов, – 101853,9 тыс. рублей.

В том числе профинансировано (в разбивке по получателям):

ГУП Республики Тыва «Котельная с. Хову-Аксы» – 19098 тыс. рублей;

ГУП Республики Тыва «Шагонартепло» – 15793 тыс. рублей;

ГУП Республики Тыва «Прогресс-тепло» – 9811 тыс. рублей;

ГУП Республики Тыва «Ак-Довуракэнерго» – 25603 тыс. рублей;

ОАО «Тувгаз» – 377 тыс. рублей;

ТЭК 4 – 31171,9 тыс. рублей;

4) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию предприяти-

ями жилищно-коммунального хозяйства муниципальных организаций, – 5038,0 тыс. рублей.

В том числе профинансировано в разбивке по получателям:

- ООО «Бай-Хаактепло» Тандинского кожууна – 278 тыс. рублей;
- Водоканал Чеди-Хольского кожууна – 1 555 тыс. рублей;
- МУП «Благоустройство» г. Кызыла – 1 477 тыс. рублей;
- Водоканал Чаа-Хольского кожууна – 303 тыс. рублей;
- МУП «Тепловик» Пий-Хемского кожууна – 1 425 тыс. рублей;

5) подготовка предприятий ТЭК к осенне-зимнему периоду и предотвращение чрезвычайных ситуаций – 40000,0 тыс. рублей.

Работы по ремонту завершены. Профинансированы субсидии предприятиям ТЭК на проведение ремонтных работ:

ГУП Республики Тыва «Ак-Довуракэнерго» – 8410,43 тыс. рублей;

ГУП Республики Тыва «Котельная с. Хову-Аксы» – 10830,63 тыс. рублей;

ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» Шагонарский участок – 5703,3 тыс. рублей;

ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» Чаа-Хольский участок – 2532,6 тыс. рублей;

ОАО «Тувгаз» – 2523 тыс. рублей;

6) утверждение схемы и программы развития электроэнергетики в Республике Тыва – 3500,0 тыс. рублей.

Корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период до 2020 года утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 29 апреля 2015 г. № 208. Исполнитель работ – ООО «ИНПЭС».

В 2016 г. реализованы следующие мероприятия:

1) подготовка предприятий ТЭК к осенне-зимнему периоду и предотвращение чрезвычайных ситуаций – 42440,8 тыс. рублей.

Мероприятия утверждены постановлением Правительства Республики Тыва от 6 июня 2016 г. № 223 «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов». По состоянию на 1 января 2017 г. профинансированы в полном объеме. Работы по текущему и капитальному ремонту проведены на 100 процентов;

2) погашение убытков по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов, – 94628,4 тыс. рублей.

Средства перечислены на погашение убытков по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов. Убытки по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанным с государственным регулированием тарифов, утверждаются Службой по тарифам Республики Тыва.

Обеспечивается бесперебойное, безаварийное прохождение отопительного сезона, в том числе за счет бюджетных средств;

3) субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса – 51200,0 тыс. рублей.

Средства перечислены на поддержку топливно-энергетического комплекса (приобретение топлива, оплата грузоперевозок, оплата электроэнергии и т.д.).

Обеспечивается бесперебойное, безаварийное прохождение отопительного сезона, в том числе за счет бюджетных средств;

4) выполнение работ по корректировке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период до 2020 года – не профинансировано;

5) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию ДЭС – 167209,0 тыс. рублей.

Средства перечислены на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию ДЭС.

За счет бюджетных средств завезен планируемый объем дизельного топлива и обеспечено бесперебойное электроснабжение;

6) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию предприятиями жилищно-коммунального хозяйства муниципальных организаций, – 20296,9 тыс. рублей.

На 1 января 2017 г. профинансировано 100 процентов предусмотренных в бюджете средств по предприятиям ЖКХ, курируемым Агентством по ЖКХ Республики Тыва. Исполнителем являлось Агентство по ЖКХ Республики Тыва;

7) проведение капитального ремонта объектов социальной сферы и республиканской собственности – 66896,1 тыс. рублей.

Проведение капитального ремонта объектов социальной сферы и республиканской собственности осуществляется Минстроем Республики Тыва и Минздравом Республики Тыва;

8) строительство котельных в гг. Ак-Довурак и Шагонар – 9500,0 тыс. рублей.

Средства перечислены на погашение кредиторской задолженности по строительству котельных в гг. Ак-Довурак и Шагонар. По состоянию на 1 января 2017 г. кредиторская задолженность по строительству котельных в гг. Ак-Довурак и Шагонар составляет 81584,0 тыс. рублей;

9) котельная с теплосетями с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района – 876,6 тыс. рублей.

В 2017 г. реализованы следующие мероприятия:

1) подготовка предприятий ТЭК к осенне-зимнему периоду и предотвращение чрезвычайных ситуаций – 87048,2 тыс. рублей (100 процентов);

2) погашение убытков по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов, – 100433,0 тыс. рублей (100 процентов);

3) субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса – 45227,4 тыс. рублей (100 процентов);

4) выполнение работ по корректировке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период до 2022 года – 4430,0 тыс. рублей (100 процентов);

5) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию ДЭС, – 191956,0 тыс. рублей (100 процентов);

6) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства муниципальных организаций, – 17406,4 тыс. рублей (100 процентов);

7) проведение капитального ремонта объектов социальной сферы и республиканской собственности – 75597,6 тыс. рублей (освоено 70926,06 тыс. рублей или 93,8 процента);

8) строительство котельных в гг. Шагонар и Ак-Довурак – 0,0 руб.;

9) котельная с теплосетями с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района – 0,0 руб.

В 2018 г. реализованы следующие мероприятия:

1) подготовка предприятий ТЭК к осенне-зимнему периоду и предотвращение чрезвычайных ситуаций – 68712,0 тыс. рублей (100 процентов);

2) погашение убытков по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов, – 138581,0 тыс. рублей (100 процентов);

3) субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса – 121100,0 тыс. рублей (100 процентов);

4) выполнение работ по корректировке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период до 2022 года – 4150,0 тыс. рублей (100 процентов);

5) выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения – 9000,0 тыс. рублей (исполнено 4440,0 тыс. рублей или 49,3 процента);

6) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию ДЭС, – 177786,0 тыс. рублей (100 процентов);

7) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию предприятиями жилищно-коммунального хозяйства муниципальных организаций, – 21851,5 тыс. рублей (100 процентов);

8) субсидии на финансовое обеспечение ГАУ Республики Тыва «ЦЭР» – 544,8 тыс. рублей (100 процентов);

9) проведение капитального ремонта объектов социальной сферы и республиканской собственности – 60244,7 тыс. рублей (исполнено 11920,6 тыс. рублей или 19,78 процента);

10) строительство котельных в гг. Ак-Довурак и Шагонар – 8000,0 тыс. рублей (100 процентов).

В 2019 г. реализованы следующие мероприятия:

- 1) подготовка предприятий ТЭК к осенне-зимнему периоду и предотвращение чрезвычайных ситуаций – 71646,0 тыс. рублей (100 процентов);
- 2) погашение убытков по выпадающим доходам предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулирование тарифов, – 182792,0 тыс. рублей (100 процентов);
- 3) субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса – 129178,82 тыс. рублей (100 процентов);
- 4) выполнение работ по корректировку схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на период до 2022 года – 4700,0 тыс. рублей (100 процентов);
- 5) выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения – 4550,0 тыс. рублей (100 процентов);
- 6) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию ДЭС, – 260153,1 тыс. рублей (100 процентов);
- 7) приобретение автономных систем электроснабжения – 23029,0 тыс. рублей (100 процентов);
- 8) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на вырабатываемую электроэнергию предприятиями жилищно-коммунального хозяйства муниципальных организаций, – 29243,70 (исполнено 27961,10 тыс. рублей или 95,6 процента);
- 9) субсидии на финансовое обеспечение ГАУ Республики Тыва «ЦЭР» – 5775,18 тыс. рублей (исполнено 5445,69 тыс. рублей или 94,2 процента);
- 10) субсидии на приобретение котельно-печного топлива для казенных бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов – 41935,32 тыс. рублей (100 процентов);
- 11) финансовое обеспечение для участия в аукционе по угольным месторождениям Правительства Республики Тыва – 2400,0 тыс. рублей (100 процентов);
- 12) приобретение резервного источника электроснабжений – 7630,0 тыс. рублей (100 процентов);
- 13) проведение капитального ремонта объектов социальной сферы и республиканской собственности – 30265,99 тыс. рублей (100 процентов).

В 2020 г. реализованы следующие мероприятия:

- 1) субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (предприятия ТЭК) – 29900,0 тыс. рублей;
- 2) субсидии на государственную поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса (дизельные электростанции) – 29900,0 тыс. рублей;
- 3) строительство котельных и тепловых сетей в городах Шагонар и Ак-Довурак – 71315,8 тыс. рублей;
- 4) субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по текущему и капитальному ремонтам с целью повышения энергетической эффективности – 74788,6 тыс. рублей;

5) субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулируемые виды деятельности и реализующим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на возмещение части затрат, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, – 218900,7 тыс. рублей;

6) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, – 267620,4 тыс. рублей;

7) субсидии на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение, вырабатываемые муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 32828,9 тыс. рублей;

8) капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности – 79496,9 тыс. рублей;

9) разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Республики Тыва – 6500,0 тыс. рублей;

10) корректировка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва – 4700,0 тыс. рублей;

11) подготовка технико-экономического обоснования по переработке угля – 7340,0 тыс. рублей;

12) субсидирование транспортных расходов перевозчиков на доставку твердого топлива (угля) до населенных пунктов и городского округа г. Ак-Довурака – 3017,2 тыс. рублей;

13) субсидии местным бюджетам на приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных в труднодоступных местностях с ограниченными сроками завоза грузов, – 43871,3 тыс. рублей;

14) субсидии ГАУ Республики Тыва «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» – 6405,2 тыс. рублей;

15) финансовое обеспечение для участия в аукционе по угольным месторождениям Правительства Республики Тыва – 3200,0 тыс. рублей;

16) реализация инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов – 3000000,0 тыс. рублей;

17) приобретение автономных систем электроснабжения – 1600,0 тыс. рублей.

В 2021 г. реализованы следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт объектов социальной сферы и республиканской собственности на сумму 41 537,00 тыс. рублей при плановом значении 43 224,00 тыс. рублей или 96,1 процента;

2) субсидии на строительство воздушных линий электропередачи.

Финансовые средства выделены на строительство по основному и резервному источнику питания: строительство 2 воздушных линий (ВЛ)-6 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ак-Довурак» для административного здания ГБУЗ Республики Тыва «Барун-Хемчикский ММЦ» и кислородной станции на сумму 8 985,0 тыс. рублей при плане 8 990,00 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9 процента.

В 2022 г. на выполнение работ по строительству линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ на территории пансионата оз. Дус-Холь Тандинского кожууна профинансировано 8 968 тыс. рублей исполнителю ООО «Бастион».

Основными направлениями деятельности Министерства в 2023 г. явились:

1) контроль реализации Комплексного плана развития инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва, утверждённого заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаком от 7 декабря 2021 г., в части обеспечения внешнего электроснабжения:

- Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения (ООО «Лунсин») к 2024 году,

- Кара-Белдирского золоторудного месторождения (ООО «Кара-Белдир») к 2025 году;

- Кызылской агломерации (нацпроект «Жилье») к 2025 году;

- Ак-Сугского горно-обогатительного комбината (ООО «Голевская горнорудная компания»), в том числе Тоджинского кожууна к 2026 году;

2) разработка государственной информационной системы «Угольная продукция».

В рамках снижения цены на уголь, отпускаемый населению Республики Тыва, был зафиксирован высокий спрос на уголь у недобросовестных предпринимателей, которые, покупая уголь, предназначенный населению, продавали его юридическим лицам, из-за чего на складах и Каа-Хемском угольном разрезе образовывались длинные очереди, в связи с чем у населения республики возникали проблемы с покупкой угля.

В целях урегулирования данного вопроса, в соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Тыва и ООО «ТГРК» от 27 декабря 2022 г., Министерство взяло на себя обязательство создать специализированную программу для ведения учета реализации твердого топлива по утвержденным нормам для каждого гражданина, проживающего в доме с печным отоплением. Основная цель – автоматизация процесса приема заявок, эффективное и рациональное распределение твердого топлива населению, повышение эффективности учетных и контрольных функций топливных складов за счет автоматизации ведения реестров.

На сегодняшний день ГИС разработана. В целях обеспечения населения Республики Тыва, проживающего в жилых домах с печным отоплением, твердым топливом (каменным углем) и для определения нормы в зависимости от площади жилого дома необходимо зарегистрировать в ГИС данные граждан (ФИО, дата рождения, СНИЛС, адрес, площадь и этажность дома).

Пользователями данной системы являются Министерство, угольные разрезы, топливные склады и население, проживающее в домах с печным отоплением.

В системе зарегистрировано 62 452 домовладения.

К приоритетным направлениям отрасли на 2024 г. отнесены следующие мероприятия:

1) мероприятия, включенные в Комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва.

В рамках реализации Комплексного плана на 2024 год запланированы следующие мероприятия:

- выполнение проектных работ, строительство и ввод подстанции ПС 220 кВ Туманная;

- строительство и постановка под напряжение объектов ПАО «ФСК ЕЭС»

- ВЛ 220 кВ «Туран – Туманная» (272 км), ПС 220 кВ «Ырбан»;

- актуализация разработанных проектно-изыскательных работ ВЛ 110 кВ Ырбан – Тоора-Хем, ПС 110 кВ Тоора-Хем;

- выполнение проектно-изыскательных работ в части ВЛ 110 кВ Лунсин – Тоора-Хем, ПС 110 кВ «Лунсин», с получением экспертизы проектно-сметной документации;

- определение возможности разработки и реализации механизма предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Тыва в целях реализации инвестиционных проектов в социальной сфере («Комплексная застройка в г. Кызыл»);

3) сотрудничество с ООО «Сибирская генерирующая компания» по вопросу стратегии развития системы теплоснабжения г. Кызыла.

Министерством выполняются мероприятия по заключению Концессионного соглашения с АО «Кызылская ТЭЦ» и отнесение городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» и пгт. Каа-Хем к ценовой зоне теплоснабжения, с включением мероприятий, направленных на повышение надежности системы централизованного теплоснабжения г. Кызыла, а именно строительство тепловых сетей, реконструкция ветхих участков сетей, подключение новых объектов к централизованному теплоснабжению;

4) проработка финансового механизма реализации проекта подключения труднодоступных населенных пунктов Монгун-Тайгинского и Тере-Хольского районов Республики Тыва к Единой энергетической системе России.

В целях обеспечения электроснабжением труднодоступных населенных пунктов Монгун-Тайгинского и Тере-Хольского районов Республики Тыва, не имеющих доступа к Единой системе электроснабжения, Министерством запланированы мероприятия по проведению сравнительного технико-

экономического анализа вариантов технологического присоединения данных населенных пунктов и соответственно разработка финансового механизма реализации проекта;

5) реализация Федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль» государственной программы «Развитие энергетики».

В целях развития в Республике Тыва электротранспорта и зарядных станций, обеспечения качественной транспортной доступности республики для владельцев электротранспорта, улучшения климатического состояния, снижения выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности Министерством планируется внедрение 4 станций быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта на территории Республики Тыва за счет субсидирования из федерального бюджета;

б) подготовка мероприятий по переводу частных домовладений с печного отопления на другие виды отопления (газовое, электрическое, с подключением к системе централизованного теплоснабжения) или комбинированное с твердотопливным котлом длительного горения.

В целях снижения уровня выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, модернизации промышленных предприятий и энергетических установок в условиях перехода на альтернативные виды топлива, для снижения выбросов вредных веществ и повышения энергетической эффективности Министерством совместно с Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва разрабатывается Комплексный план по снижению уровня загазованности г. Кызыла;

7) мероприятия по газификации Республики Тыва.

Министерством совместно со структурами ПАО «Газпром» проведена актуализация Топливо-энергетического баланса Республики Тыва в части обоснования использования сжиженного природного газа (далее – СПГ) как оптимального по затратам и экологическим требованиям вида топлива. На сегодняшний день документ проходит согласование у собственника единой системы газоснабжения ПАО «Газпром».

В рамках предложений по автономной газификации Республики Тыва рассмотрены (так же, как и в варианте сетевой газификации) все предложенные потребители с общим годовым потреблением газа 542,6 млн. куб. м/год, что эквивалентно 360 тыс. т/год СПГ.

В настоящий момент источники, способные обеспечить заданные объемы СПГ, отсутствуют. Для их обеспечения рассматривались три потенциальных места размещения комплекса сжижения природного газа (далее – КСПГ):

КСПГ Ачинск;

КСПГ Красноярск;

КСПГ Канск.

С точки зрения удалённости от трасс перспективных магистральных газопроводов все три потенциальные площадки находятся в одном радиусе.

В части автодорожного сообщения размещение КСПГ в районе г. Ачинск является наиболее приоритетным.

В текущих условиях отсутствия железнодорожного сообщения с Респуб-

ликой Тыва базовой схемой производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ принимается схема, предполагающая:

- производство: строительство КСПГ в р-не г. Ачинск общей производительностью 67 т/ч;
- хранение: строительство перевалочного терминала (хаба) в г. Кызыл с резервуаром 4000 куб. м;
- доставка СПГ: создание транспортного управления на один транспортный участок «Ачинск – Кызыл» с его расширением, формирование дополнительных транспортных участков;
- регазификация и газораспределение от станций приема, хранения и регазификации (СПХР) до потребителей: строительство 148 СПХР.



Суммарные инвестиционные затраты по варианту автономного газоснабжения оцениваются в 68,3 млрд. рублей, что существенно меньше по сравнению с сетевым вариантом газоснабжения.

Также в целях последующей реализации мероприятий по газификации, планируется разработка технико-экономического обоснования ТЭО газификации Республики Тыва.

3. Финансирование Программы

За период с 2014 по 2023 гг. в целях реализации мероприятий Программы профинансировано всего 22 987,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 15 695,4 млн. рублей, из республиканского бюджета – 7 292,1 млн. рублей, внебюджетных средств – 2 785,00 млн. рублей.

Финансирование отрасли				
годы	всего (млн. руб.)	из них ФБ (млн. руб.)	РБ (млн. руб.)	ВБ (млн. руб.)
2014	906,0	428,6	477,4	0
2015	411,8	0	411,8	0
2016	442,9	0	442,9	0
2017	517,4	0	517,4	0
2018	578,0	0	578,0	0
2019	791,7	0	791,7	0
2020	3871,8	3007,3	864,5	0
2021	5289,2	4245,8	1043,4	0
2022	4685,9	3491,3	1194,6	0
2023	5492,8	4522,4	970,4	2785,0
Итого	22987,3	15695,4	7292,1	2785,0

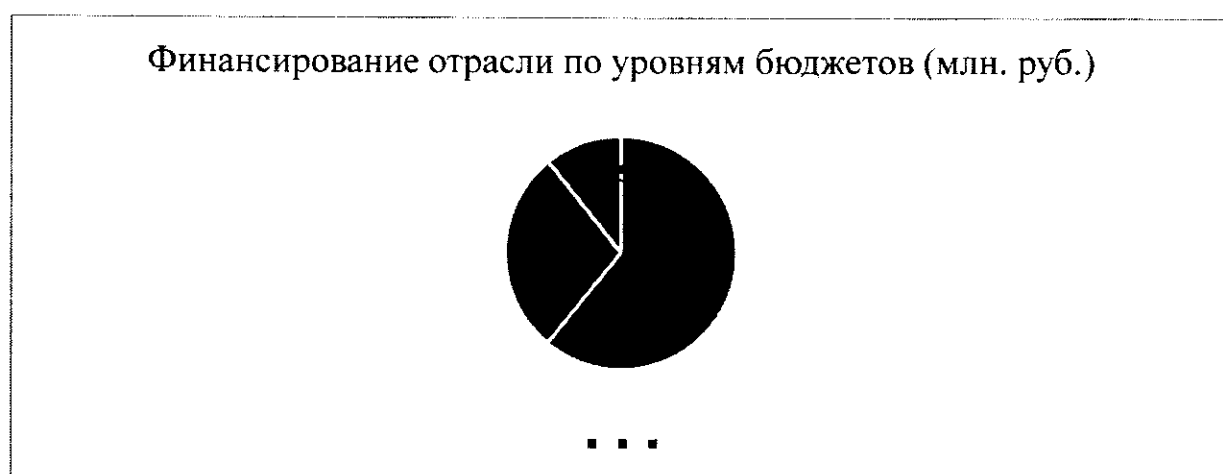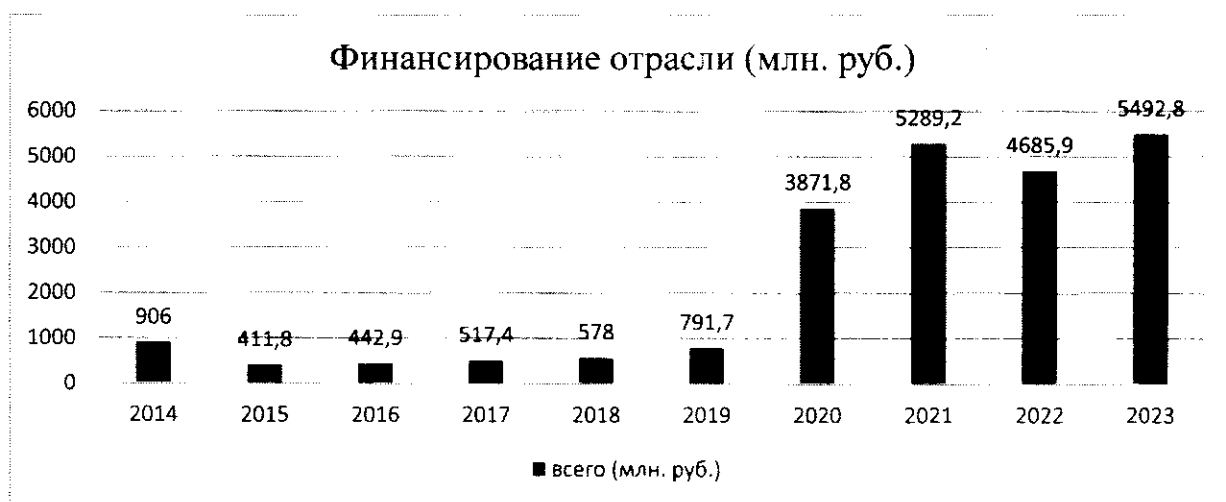

В Программу включены 4 подпрограммы:

- 1) «Государственная поддержка предприятий топливно-энергетического комплекса»;
- 2) «Модернизация и строительство объектов топливно-энергетического комплекса Республики Тыва»;
- 3) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Тыва»;
- 4) «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Тыва на 2019-2027 годы».

На государственную поддержку предприятий ТЭК с 2014 по 2023 гг. выделено субсидии на сумму 855,9 млн. рублей.

На модернизацию и строительство объектов ТЭК с 2014 по 2023 гг. выделено субсидии на сумму 2 923,4 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» с 2014 по 2023 гг. выделено субсидии на сумму 19 208,0 млн. рублей.

Финансирование Программы в 2023 году

Общий объем бюджетных ассигнований (далее – БА) Программы, предусмотренных в 2023 г. составляет 5 492,8 млн. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 4 522,4 млн. рублей (82 процента от общей суммы БА);

средства республиканского бюджета 970,4 млн. рублей (18 процентов от общей суммы БА).

Республиканские средства

Из республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2024 г. профинансировано:

1) на государственную поддержку предприятий ТЭК – 50 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» – 11 959,26 тыс. рублей, которые, в целях бесперебойного прохождения отопительного периода, направлены на оплату поставки каменного угля 1549,6 тонн, для растопки котлов на участках в гг. Ак-Довурак, Шагонар и в сс. Хову-Аксы, Чаа-Холь и оплату услуг перевозки каменного угля до котельных на участках;

- ООО «Дизель» – 38 040,74 тыс. рублей, которые направлены на приобретение и перевозку дизельного топлива в количестве 300 т и частичную оплату заработной платы сотрудников за декабрь 2023 г.;

2) на приобретение дизельных генераторных установок (далее – ДГУ) в количестве 9 единиц на сумму 32 259,00 тыс. рублей, в том числе: 2 единицы ДГУ (30кВт), установлены и синхронизированы в с. Качык Эрзинского кожууна, с. Сыстыг-Хем Тоджинского кожууна; 5 единиц ДГУ (500кВт): 1 ед. в резерве Тоджинского кожууна, 4 ед. в резерве для Монгун-Тайгинского кожууна, с. Мугур-Аксы; 1 ед. ДГУ (200кВт) установлены и синхронизированы в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна, 1 ед. ДГУ (200кВт) – установлен в с. Ырбан Тоджинского кожууна;

3) 13 295,90 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту электрических сетей детских стационарных лагерей отдыха на территории Тандинского кожууна Республики Тыва произведена полная оплата контракта № 1ГК/2023 от 2 июня 2023 г. ООО «Специализированный застройщик «Бастион»;

4) субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по текущему и капитальному ремонту с целью повышения энергетической эффективности на сумму 92 327,00 тыс. рублей, которые направлены на:

- материалы, оборудование для ремонта и замены вспомогательного оборудования котельных 71 159,077 тыс. рублей;

- выполнение работы по капитальному ремонту основного оборудования котельной (капремонт пароперегревателя котлоагрегата К-35-40 № 7 котельной) на общую сумму 8 514,13 тыс. рублей;

- выполнение работ по текущему ремонту ВЛ 6 кВ ф. 1-04, ф. 1-09 г. (г. Ак-Довурак) на общую сумму 926,66 тыс. рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту основного оборудования котельной № 2 Чаа-Хольского участка на общую сумму 8 081,83 тыс. рублей;

- перевозка строительных материалов на общую сумму 1 640 тыс. рублей;

- проведение экспертизы промышленной безопасности на общую сумму 1 654,5 тыс. рублей;

- проведение оценки и обследования оборудования на общую сумму 350,803 тыс. рублей;

5) 311 699,75 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов, в том числе:

ГУП «УК ТЭК-4» в сумме 305 825,65 тыс. рублей, в целях обеспечения бесперебойного, безаварийного прохождения отопительного сезона, направлены на:

- 221 996,45 тыс. рублей – на поставку каменного угля в общем объеме 63 013,4686 тонн угля для работы котельных на участках:

- г. Ак-Довурак 33 600 тонн – 118 372,8 тыс. рублей;

- г. Шагонар 18 213,4686 тонн – 64 166,05 тыс. рублей;

- с. Хову-Аксы 8 000 тонн – 28 184,0 тыс. рублей;

- с. Чаа-Холь 3 200 тонн – 11 273,6 тыс. рублей;

- 49 352,35 тыс. рублей – за услуги перевозки каменного угля до котельных на участках предприятия;

- 13 550,00 тыс. рублей – за оказанные услуги по охране объектов предприятия ООО ЧОО «ГРОМ»;

- 20 000,00 тыс. рублей – оплата задолженности за приобретенную электрическую энергию перед АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на основании акта сверки взаимных расчетов;

- 486,90 тыс. рублей – в целях бесперебойного прохождения отопительного периода в г. Ак-Довурак, приобретены билы из материала марки 110Г13Л для ММТ-1000 в количестве 300 штук для Ак-Довуракского участка;

- 200,00 тыс. рублей – оплата задолженности за приобретенное водоснабжение перед ООО «Водопроводно-канализационные сети» на основании акта сверки;

- 200,00 тыс. рублей – оплата задолженности за приобретенное водоснабжение перед МУП «Алды-Шынаа г. Шагонар» на основании акта-сверки взаимных расчетов;

ООО «Городской сервис» в сумме 5 874,1 тыс. рублей – приобретено 194,315 т сжиженного газа;

6) ООО «Дизель» профинансировано 362 299,10 тыс. рублей. Средства перечислены на погашение недополученных доходов предприятий топливно-энергетического комплекса, связанных с государственным регулированием тарифов.

Бюджетные средства направлены на:

- приобретение дизельного топлива в объеме 2 890,848 тонн – 204 921,74 тыс. рублей;

- на приобретение моторных масел – 1 308,91 тыс. рублей;

- оказание услуг по транспортировке ДТ – 32 826,78 тыс. рублей;

- оплату труда сотрудникам ООО «Дизель» – 43 666,80 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ – 5 518,377 тыс. рублей;

- страховые взносы и налоги – 16 763,46 тыс. рублей;
- оплату охранных услуг – 5 095,69 тыс. рублей;
- оплату фактической экономии энергетического ресурса на объектах АГЭУ (ХЕВЕЛ) – 47 560,52 тыс. рублей;
- на покупку материалов для ремонта Тере-Хольского участка – 10 155,20 тыс. рублей;

7) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Центр энергосбережения и перспективного развития при Правительстве Республики Тыва» выделены в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2015 г. № 603 «О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» на сумму 3917,00 тыс. рублей;

8) по состоянию на 1 января 2024 г. профинансировано 61522,88 тыс. рублей бюджетным учреждением муниципальных образований. В соответствии с Программой субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:

- а) на приобретение каменного угля (древесины топливной);
- б) на оплату транспортных расходов по доставке приобретенного каменного угля (древесины топливной);

9) на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготного тарифа на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей за 2022 год «Россети Сибирь Тываэнерго» профинансировано 1304,0 тыс. рублей;

10) на реализацию мероприятий по поставке оборудования, материалов для создания аварийного запаса и повышения энергетической эффективности на сумму 6 500,0 тыс. рублей для создания аварийного запаса предприятий ООО «Дизель» и ГУП УК «ТЭК-4»;

11) 26006,32 тыс. рублей на выполнение реконструкции и ремонтных (аварийных) работ на объектах электросетевого хозяйства садоводческих некоммерческих товариществ;

12) 2170,10 тыс. рублей на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, выполняемое в рамках масштабных инвестиционных программ;

13) 1000,0 тыс. рублей на электроснабжение участка проведения национального праздника «Наадым – 2023»;

14) 5 276,68 тыс. рублей на субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва, возникающих при возмещении недополученных доходов территориальных сетевых организаций, функционирующих в Республике Тыва, образованных вследствие утверждения тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованных тарифов, АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Федеральные средства

1. В целях реализации мероприятий комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на терри-

тории Республики Тыва заключено соглашение между Минпромторгом России и Правительством Республики Тыва о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее – ИМБТ), имеющего целевое назначение, на реализацию инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки цветных металлов.

Общий объем бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета бюджету республики за период с 2020 по 2023 гг., составляет 14,00 млрд. рублей, в том числе:

- за 2020 – 3,00 млрд. рублей;
- 2021 – 4,00 млрд. рублей;
- 2022 – 3,00 млрд. рублей;
- 2023 – 4,00 млрд. рублей.

В соответствии с пунктом 4.3.4 соглашения Министерство ежегодно предоставляет в ГИС «Электронный бюджет» отчеты о:

- 1) расходах бюджета Республики Тыва, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ;
- 2) достижении значений результатов предоставления ИМБТ и обязательствах, принятых в целях их достижения.

По состоянию на 1 января 2024 г. отчеты в ГИС «Электронный бюджет» направлены в Минпромторг России для дальнейшего рассмотрения и подписания.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии по предоставлению субсидии юридическим лицам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, выполняемое в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва, от 23 июня 2020 г. № 1 получателем субсидии признано ООО «Голевская горнорудная компания» (далее – Компания).

Между Министерством и ООО «Голевская горнорудная компания» заключено соглашение от 3 июля 2020 г. № 1-АС, согласно которому предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва в связи с реализацией мероприятий, направленных на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, выполняемого в рамках реализации инвестиционных проектов по организации добычи меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении в Республике Тыва.

Освоение субсидии за период с 2020 по 2023 гг. составило 100 процентов.

Согласно условиям соглашения компания ежеквартально представляет в Министерство отчеты о достижении показателей результативности предоставления субсидии. Ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет отчеты в форме статистического наблюдения.

К основным показателям результативности использования субсидии относятся:

- 1) дополнительные рабочие места. К 2027 г. количество увеличится от 60 до 2000 единиц с даты заключения соглашения;

2) максимальная мощность энергопринимающих устройств юридического лица, в отношении которого осуществлено технологическое присоединение, устанавливается 161 мегаватт к 31 декабря 2024 г.;

3) общий объем внебюджетных инвестиций к концу 2027 г. составит 62 млрд. рублей;

4) сроки технологического присоединения, выполняемого в рамках реализации инвестиционных проектов, установлены на 2024 г.

Наименование показателей	Единица измерения	2020		2021		2022		2023	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1. Дополнительные рабочие места	единица	60	60	60	62	5	8	10	10
2. Максимальная мощность энергопринимающих устройств юридического лица, в отношении которого осуществлено технологическое присоединение	мегаватт, тысяча киловатт								
3. Общий объем внебюджетных инвестиций	миллион рублей	4922,75	4984,34	2204,10	2232,78	690,24	747,92	1551,3	1621,03
4. Соблюдение сроков технологического присоединения, выполняемого в рамках реализации инвестиционных проектов	год								

За отчетные периоды показатели результативности предоставления субсидии достигнуты уровня 100 процентов.

2. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 «Об утверждении госпрограммы Российской Федерации «Развитие энергетики» между Правительством Республики Тыва и ФАС России заключено соглашение от 30 декабря 2021 г. № 161-09-2022-001 с ФАС России о предоставлении субсидии при компенсации выпадающих доходов сетевых организаций в Республике Тыва, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня.

В 2023 г. профинансировано бюджетных ассигнований в размере 527,7 млн. рублей.

По результатам отбора получателем субсидии в 2023 г. определено АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Показателем результативности является соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии по утвержденным тарифам с учетом субсидии и необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии по утвержденным тарифам без учета субсидии.

В 2023 г. по результатам использования субсидии достигнуто 100 процентов исполнения.

3. В рамках Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Республики Тыва о предоставлении межбюджетного трансферта (далее – МБТ) из бюджета города Москвы бюджету Республики Тыва в целях реализации социально значимых проектов в Республике Тыва от 17 августа 2022 г. по мероприятию «Приобретение и замена котлоагрегатов и вспомогательного оборудования для котельной с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна (2 котлоагрегата, 2 дутьевых вентилятора, 2 батарейных циклона, 1 дымосос, 2 трансформатора)» заключено 4 договора на общую сумму 40 591 000,00 руб.

По условиям договора от 21 августа 2022 г. № 16/22-ПД/МКХ-А на выполнение работ по замене водогрейного котельного агрегата и увеличению электрической мощности КТП котельной с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна, заключенному между ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» и ООО «Энергоремонт», на общую сумму 7 850 818,00 руб. срок выполнения работ в соответствии с техническим заданием к договору составлял до 10 декабря 2022 г.

В случае реализации работ по замене водогрейного котельного агрегата № 3 в котельной с. Хову-Аксы требовалось прохождение части отопительного периода 2022-2023 годов без резерва тепловой мощности в котельной, что могло создать значительное снижение надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в с. Хову-Аксы.

В связи с отсутствием технической возможности проведения полного комплекса работ по замене котлоагрегата № 3 в котельной с. Хову-Аксы в условиях прохождения отопительного периода 2022-2023 годов без риска нарушения теплоснабжения потребителей с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района срок исполнения данных работ был перенесен до 1 июля 2023 г. ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4», и ООО «Энергоремонт» было заключено дополнительное соглашение от 30 декабря 2022 г. № 1 о продлении срока выполнения работ до 1 июля 2023 г.

По причине задержки со стороны ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» вывода из эксплуатации котлоагрегата № 3 в котельной с. Хову-Аксы в отопительном периоде 2022-2023 годов с учетом завершения отопительного периода 2022-2023 годов в Чеди-Хольском кожууне 22 мая 2023 г. подрядчиком проведены демонтажные работы в более поздний срок, что повлияло на срок выполнения работ по замене котлоагрегата № 3. ГУП Республики Тыва «УК ТЭК 4» и

ООО «Энергоремонт» было заключено дополнительное соглашение № 2 от 20 июня 2023 г. о продлении срока выполнения работ до 15 августа 2023 г.

Подрядчиком ООО «Энергоремонт» работы по замене котлоагрегата № 3 без пусконаладочных работ выполнены до 31 августа 2023 г.

По состоянию на 1 января 2023 г. бюджету республики из бюджета г. Москвы были выделены межбюджетные трансферты в размере 785,08 тыс. рублей ГУП УК «ТЭК-4». Работы по замене водогрейного котельного агрегата и увеличению электрической мощности КТП котельной с. Хову-Аксы полностью выполнены.

4. Оценка эффективности реализации государственной программы

Для достижения целей и выполнения поставленных задач в сфере топливно-энергетического комплекса в Программе предусмотрены целевые показатели, в результате достижения которых проводится оценка эффективности реализации Госпрограммы.

В среднем количество целевых индикаторов ежегодно составляет 10 за исключением 2015 года, где общее количество целевых индикаторов составляет 40. Ежегодно показатели результативности достигают уровня 100 процентов.

1. Достижение показателей

Год	Общее количество целевых индикаторов	Достигнуты	Частично достигнуты	Не достигнуты	Оценка степени реализации
2014	6	2	3	1	63,33%
2015	40	20	8	12	62,00%
2016	9	6	3	-	86,67%
2017	9	7	2	-	91,11%
2018	7	5	2	-	88,57%
2019	9	6	3	-	86,67%
2020	11	10	-	1	90,91%
2021	10	8	2	-	92,00%
2022	10	2	6	2	56,00%
2023	12	8	2	2	76,67%
Среднее Значение	12,3	7,4	3,44	3,6	79,39%

Согласно разделу 2 приказа Минэкономразвития Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 261 оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

$$СД_{и} = \sum СД_{игп} / N,$$

где:

СД_и – степень достижения показателей (индикаторов) государственной

программы (подпрограммы);

$СД_{ИГП}$ – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы), при этом:

$СД_{ИГП}$ приравнивается 1, если показатель (индикатор) «Достигнут»;

$СД_{ИГП}$ приравнивается 0,6, если показатель (индикатор) «Частично достигнут»;

$СД_{ИГП}$ приравнивается 0, если показатель (индикатор) «Не достигнут»;

N – число показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы).

При использовании данной формулы в случаях, если $СД_{ИГП} > 1$, значение $СД_{ИГП}$ принимается равным 1.

Расчет степени достижения планового значения показателя индикатора:

Показатель достигнут – 7,4, показатель частично достигнут – $3,44 \times 0,6 = 2,064$

$7,4 + 2,06 = 9,46$

$9,46 / 12,3 = 0,76$

Итого степень достижения показателей (индикаторов) государственной программы составило – 0,76.

2. Освоение объема финансирования государственной программы

Год	Лимит финансирования (РБ и ФБ)	Освоение финансирования (РБ и ФБ)	Степень освоения объема финансирования, процентов
2014	906,0	905,98	99,99
2015	411,8	411,8	100
2016	442,9	442,86	99,99
2017	517,4	517,4	100
2018	578,0	577,96	99,99
2019	791,7	791,68	99,99
2020	3871,8	3871,76	99,99
2021	5289,2	5289,18	99,99
2022	4685,9	4685,85	99,99
2023	5492,8	5492,75	99,99
Среднее Значение	22987,3	22982,36	99,97

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается для каждой государственной программы (подпрограммы) как отношение фактического объема освоенных средств к запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Э_{ис} = \Phi_{ГП} / П_{ГП},$$

где:

$Э_{ис}$ – эффективность использования средств бюджета;

$\Phi_{ГП}$ – объем фактически профинансированных средств;

$P_{ГП}$ – объем финансирования, предусмотренный в бюджете.

Расчет:

$$22982,36/22987,3=0,999$$

Итого: Эффективность использования средства бюджета составляет – 0,99

3. Исполнение мероприятий государственной программы

Год	Общее количество мероприятий	Исполнено/в исполнении	Не исполнено	Степень реализации государственной программы, процентов
2014	8	8	0	100
2015	6	6	0	100
2016	9	8	1	88
2017	9	7	2	77
2018	10	9	1	90
2019	13	13	0	100
2020	17	17	0	100
2021	22	22	0	100
2022	17	16	1	94
2023	17	17	0	99,96
Среднее значение	12,8	12,3	0,5	95

Согласно пункту 4.1 приказа Минэкономразвития Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 261 расчет степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы) осуществляется на уровне основных мероприятий подпрограмм.

Согласно пункту 4.2 Степень реализации мероприятий оценивается для каждой государственной программы (подпрограммы) как доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий по следующей формуле:

$$СРМ = МВ/М,$$

где:

СРМ – степень реализации мероприятий;

МВ – количество выполненных мероприятий из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет:

$$12,3/12,8=0,96 \times 100=96\%$$

Мероприятие считается выполненным, если доля наступивших контрольных событий, относящихся к данному мероприятию в соответствии с детальным планом-графиком реализации государственной программы, от числа всех контрольных событий, относящихся к данному мероприятию, в процентном выражении составляет не менее 75 процентов.

С учетом вышеуказанных расчетов согласно пункту 5 приказа Минэкономразвития Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 261 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва», расчет эффективности реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\text{ЭРГП} = 0,5 \times \text{СДИ} + 0,25 \times \text{ЭИС} + 0,25 \times \text{СРМ},$$

где:

ЭРГП – эффективность реализации государственной программы;

СДИ – степень достижения показателей (индикаторов) государственной программы;

ЭИС – эффективность использования средств бюджета;

СРМ – степень реализации мероприятий государственной программы.

Расчет по показателям государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы:

СДИ –

ЭИС – 0,99;

СРМ – 0,96.

$$0,5 \times 0,76 + 0,25 \times 0,99 + 0,25 \times 0,96 = 0,38 + 0,247 + 0,24 = 0,86$$

Итого эффективность реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2027 годы» составило – $0,867 \times 100 = 86,7\%$.

Согласно пункту 5.2 приказа Минэкономразвития Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 261 оценка эффективности реализации государственных программ производится градация государственных программ по следующим критериям:

Эффективными являются программы с эффективностью реализации (ЭРГП) более 90 процентов до 100 процентов включительно;

Среднеэффективными являются программы с эффективностью реализации (ЭРГП) более 70 процентов до 89,99 процента включительно;

Низкоэффективными являются программы с эффективностью реализации (ЭРГП) более 20 процентов до 69,99 процента включительно;

Неэффективными являются программы с эффективностью реализации (ЭРГП) 20 процентов и менее.

5. Выводы и предложения

За период реализации Программы с 2014 по 2023 годы поставленные задачи выполнялись.

По результатам оценки эффективности реализации Программы возможно сделать вывод о том, что Министерством целевые показатели достигли уровня 99,9 процента, что соответствует запланированным результатам.

Финансирование и реализация мероприятий Программы осуществлялось согласно кассовому плану Министерства.

Согласно произведенным расчетам Программа является среднеэффективной, эффективность составила 86,7 процента.
